

석면비산측정 결과보고서

- 전남환경교육센터 지정폐기물 철거공사 -



(주)광주환경산업


Gwang Ju Environment Industry CO.,LTD

[별 첨 2] 측정 결과

2017년 12월 23일				
측정위치	측정시간(분)	유량 (L/min)	측정결과 (기준: 0.01개/cm ³)	결과
*1 부지경계선1	11:00 ~ 15:10	9.87	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*2 부지경계선2	11:00 ~ 15:10	9.89	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*3 부지경계선3	11:05 ~ 15:15	9.87	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*4 부지경계선4	11:05 ~ 15:15	9.89	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*5 작업장주변1	11:10 ~ 13:20	9.87	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*6 작업장주변2	14:00 ~ 16:10	9.87	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*7 위생설비입구	11:15 ~ 12:00	9.87	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*8 음압기 배출구1	11:20 ~ 12:05	9.89	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*9 음압기 배출구2	14:00 ~ 14:45	9.87	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*10 음압기 배출구3	15:00 ~ 15:45	9.89	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*11 폐기물 반출구1	13:00 ~ 13:45	9.87	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*12 폐기물 반출구2	15:10 ~ 15:55	9.87	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*13 폐기물 반출구3	16:00 ~ 16:45	9.87	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만

[별첨 1] 측정 지정 위치(도식도)



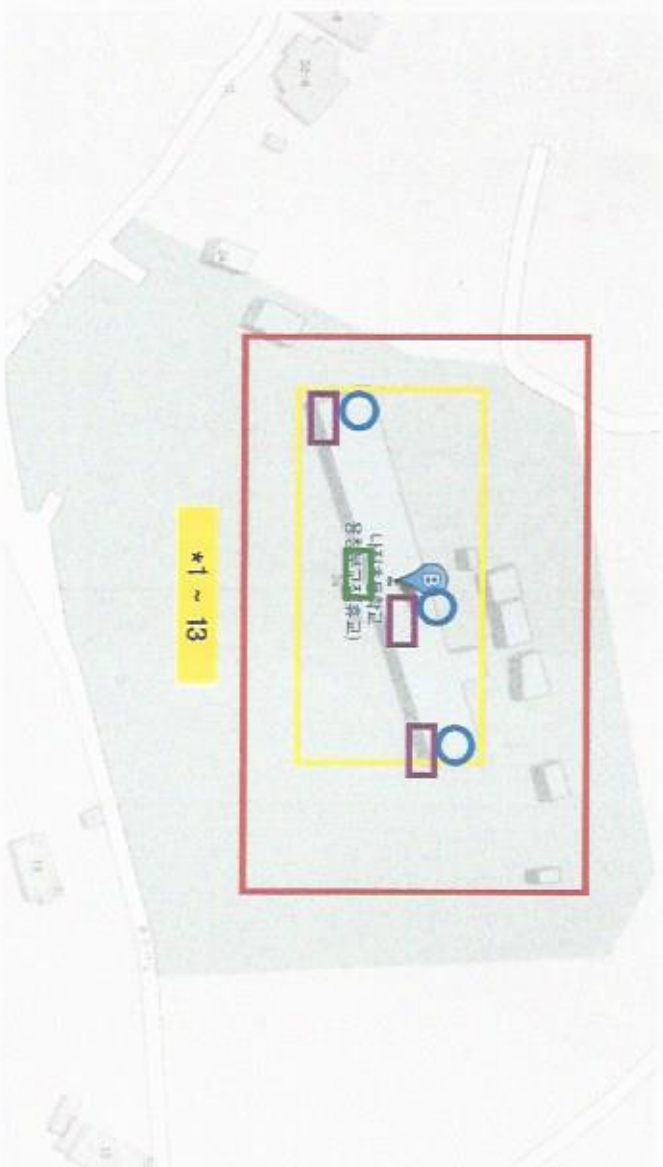






나진초등학교 용창분교장



범례	
	입원구역
	다성간 측물
	위상선비
	표기물 배출구
	응답기배출구
	시료채취위치

* 비고

[별 첨 3] 측정 사진

2017년 12월 23일			
			
*1 부지경계선1	*2 부지경계선2	*3 부지경계선3	*4 부지경계선4
			
*5 작업장 주변1	*6 작업장 주변2	*7 위생설비 입구	*8 음압기 배출구1
			
*9 음압기 배출구2	*10 음압기 배출구3	*11 폐기물 반출구1	*12 폐기물 반출구2
			
*13 폐기물 반출구3			

[별지 제17호의6서식] <신설 2009.8.7>

석면해체·제거작업 신고서				처리기간 7일	
① 신고번호		(지방노동청) - 호	② 건축물 등록번호		4613033022-1-15150017
<input checked="" type="checkbox"/> 건축물 <input type="checkbox"/> 설비	③ 위치(소재지)	전라남도 여수시 화양면 용문사길 24	④ 건물명(설비명)	여수 나진초등학교 용창분교	
	⑤ 용도	교실	⑥ 구조	철근콘크리트	
	⑦ 건축물 수	1동	⑧ 연면적	1,190.27㎡	
	⑨ 세대 수	지하 층/지상 2층			
소유자	⑩ 성명	전라남도 소관청 교육감	⑪ 전화번호	061-260-0883	
	⑫ 주소	전라남도 무안군 삼향읍 어진누리길 10			
석면해체·제거업자	⑬ 대표자 성명	최정식	⑭ 노동부 등록번호	제4432호	
	⑮ 사업체명	오륜기업(주)	⑯ 전화번호	TEL:061-681-6691 FAX:061-681-6086	
직업장	⑰ 공사현장명 (공사명·작업명)	가정 전남환경교육센터 지정폐기물(석면) 철거공사		⑰ 전화번호	061-681-6691
해체사유	⑱ 해체사유	천거공사로 인한 석면해체			
	⑳ 해체기간	신고증명서 교부일로부터 2017년 12월 27일까지			
② 석면 함유 자재(물질)의 종류 및 면적		종류		면적(㎡) · 부피(㎥) · 길이(m)	
		1. 분무재(뿜칠재)			
		2. 내화피복재			
		3. 천장재		676.96㎡	
		4. 지붕재			
		5. 벽재(벽체의 마감재)		14.47㎡	
		6. 바닥재			
		7. 파이프보온재			
		8. 단열재			
		9. 개스킷			
		10. 기 타(칸이 부족할 경우에는 별도 첨부)			
②② 현장책임자		주현	②③ 전화번호	061-681-6691	
②④ 작업 근로자 인적사항 (칸이 부족할 경우에는 별도 첨부)	성명	생년월일	주소		
	--별도첨부--				
<p>「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의7제1항에 따라 위와 같이 신고합니다. 2017년 12월 15일 신고인 오륜기업(주)(서명 또는 인)</p>					
<p>광주고용노동청 여수지청장 귀하</p>					
<p>※ 첨부서류 1. 공사계약서 사본 2. 석면해체·제거 작업계획서(비산 방지 방법 및 폐기물 처리방법 포함) 3. 석면조사 결과서</p>					
					수수료 없음
