

석면 비산 정도 측정 결과표

1. 사업장 개요

현장명(공사명·작업명)	에어리퀴드코리아 사무동 철거공사
현 장 소 재 지	전라남도 여주시 여수산단2로 263
석면건축자재 면적 (㎡)	787.5㎡ (천장재)
석면해체·제거 작업 신고번호	여수-20180007

2. 측정 의뢰자(석면해체·제거업자)

상 호 (대 표 자)	(유)풀빛건설 (이미경)
주 소	전라남도 여주시 조은길 18, 1층(화장동)
연 락 처	061-685-8444

3. 측정기관(고용노동부 지정번호 : 제2010-1200001호)

상 호 (대 표 자)	(유)지구환경공사 (정채영)
주 소	전라남도 여주시 반월1길 14-7 (선원동)
사 업 자 등 록 번 호	417-81-11140
연 락 처	061) 686-5237

4. 측정자(분석자 포함)

성 명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비 고
문병기	인력기준 "가"항에 해당하는 자	05202150530K	측정자
송 훈	석면조사 및 정도관리 평가(적합)	KAP-86	분석자

5. 측정일시 2018년 2월 21일 ~ 2018년 2월 21일 (1일간)

6. 측정결과

시료번호	측정지점	환산채취공기량(L)	측정결과(f/cc)	석면배출허용기준 초과여부
# 별첨 1				

7. 측정 지점 위치(도식도)

별첨 2

『석면안전관리법 시행규칙』 제38조제5항에 따라 석면비산정도 측정 결과를 위와 같이 제출합니다.

2018 년 2 월 22 일



전라남도 여주시 반월1길 14-7
유한회사 지구환경공사
대표이사 정 채 영




석면해체·제거업자 : (유)풀빛건설 대표이사 귀하

□측 정 일 : 2018년 2월 21일

JG-QP-17-03 Rev.00 - 2 - 210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용종이))

별첨 2. 측정 지점 위치(도식도)

- 현 장 명 : 에어리퀴드코리아 사무동 철거공사
□ 측 정 일 : 2018년 2월 21일

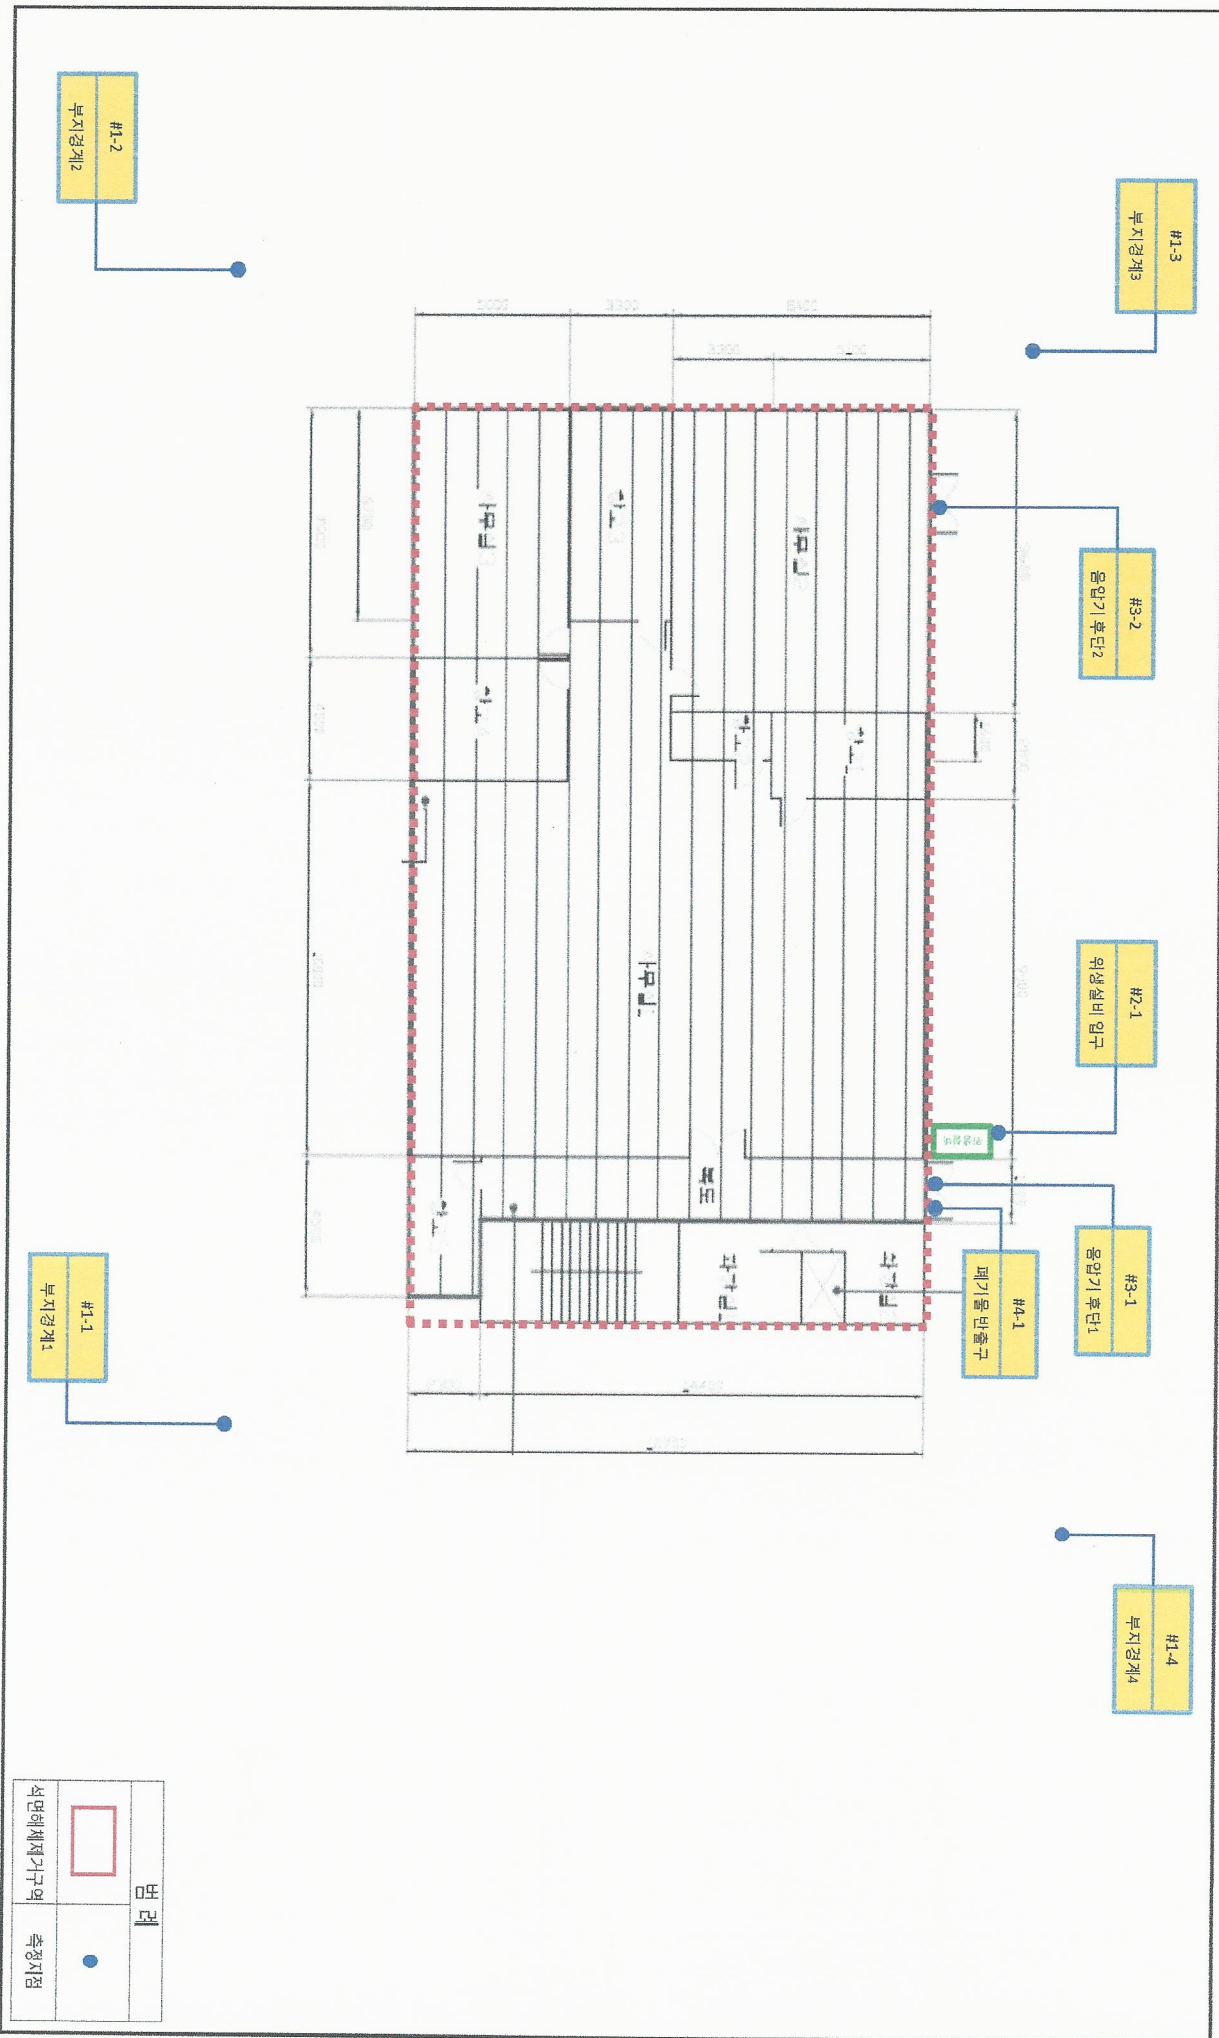

[첨부. 시료채취 및 분석 사진]







□ 현 장 명 : 에어리퀴드코리아 사무동 철거공사

□ 측 정 일 : 2018년 2월 21일

구 분	현장사진	시료·분석사진
No. 1 <input type="checkbox"/> 시료번호 : #1-1 <input type="checkbox"/> 채취위치 : 부지경계선 1 (부지경계선) <input type="checkbox"/> 측정결과(f/cc) : 불검출 <input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합		
No. 2 <input type="checkbox"/> 시료번호 : #1-2 <input type="checkbox"/> 채취위치 : 부지경계선 2 (부지경계선) <input type="checkbox"/> 측정결과(f/cc) : 불검출 <input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합		
No. 3 <input type="checkbox"/> 시료번호 : #1-3 <input type="checkbox"/> 채취위치 : 부지경계선 3 (부지경계선) <input type="checkbox"/> 측정결과(f/cc) : 불검출 <input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합		
No. 4 <input type="checkbox"/> 시료번호 : #1-4 <input type="checkbox"/> 채취위치 : 부지경계선 4 (부지경계선) <input type="checkbox"/> 측정결과(f/cc) : 불검출 <input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합		
No. 5 <input type="checkbox"/> 시료번호 : #2-1 <input type="checkbox"/> 채취위치 : 위생설비 입구 (위생설비 입구) <input type="checkbox"/> 측정결과(f/cc) : 불검출 <input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합		

□ 현 장 명 : 에어리퀴드코리아 사무동 철거공사

□ 측 정 일 : 2018년 2월 21일

구 분	현장사진	시료·분석사진
No. 6 <input type="checkbox"/> 시료번호 : #3-1 <input type="checkbox"/> 채취위치 : 2층 출입구1 (음압기) <input type="checkbox"/> 측정결과(f/cc) : 불검출 <input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합		
No. 7 <input type="checkbox"/> 시료번호 : #3-2 <input type="checkbox"/> 채취위치 : 2층 출입구2 (음압기) <input type="checkbox"/> 측정결과(f/cc) : 불검출 <input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합		
No. 8 <input type="checkbox"/> 시료번호 : #4-1 <input type="checkbox"/> 채취위치 : 2층 출입구1 (폐기물 반출구) <input type="checkbox"/> 측정결과(f/cc) : 0.005 <input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합		

석면 비산 정도 측정 결과표

1. 사업장 개요

현장명(공사명·작업명)	에어리퀴드코리아 사무동 철거공사
현 장 소 재 지	전라남도 여주시 여수산단2로 263
석면건축자재 면적 (㎡)	787.5㎡ (천장재)
석면해체·제거 작업 신고번호	여수-20180007

2. 측정 의뢰자(석면해체·제거업자)

상 호 (대 표 자)	(유)폴빛건설 (이미경)
주 소	전라남도 여주시 조은길 18, 1층(화장동)
연 락 처	061-685-8444

3. 측정기관(고용노동부 지정번호 : 제2010-1200001호)

상 호 (대 표 자)	(유)지구환경공사 (정채영)
주 소	전라남도 여주시 반월1길 14-7 (선원동)
사 업 자 등 록 번 호	417-81-11140
연 락 처	061) 686-5237

4. 측정자(분석자 포함)

성 명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비 고
문병기	인력기준 "가"항에 해당하는 자	05202150530K	측정자
송 훈	석면조사 및 정도관리 평가(적합)	KAP-86	분석자

5. 측정일시 2018년 2월 22일 ~ 2018년 2월 22일 (1일간)

6. 측정결과

시료번호	측정지점	환산채취공기량(L)	측정결과(f/cc)	석면배출허용기준 초과여부
# 별첨 1				

7. 측정 지점 위치(도식도)

별첨 2

『석면안전관리법 시행규칙』 제38조제5항에 따라 석면비산정도 측정 결과를 위와 같이 제출합니다.

2018년 2월 23일



전라남도 여주시 반월1길 14-7

유한회사 지구환경공사

대표이사 정 채 영



석면해체·제거업자 : (유)폴빛건설 대표이사 귀하

별첨 1. 측정결과

□ 현 장 명 : 에어리퀴드코리아 사무동 철거공사

□ 측 정 일 : 2018년 2월 22일

No.	시료번호	측정		환산한 채취 공기량(L)	측정결과 (f/cc)	석면배출허용기준 초과여부(0.01 f/cc)
		위치	지점			
1	# 1-1	부지경계선 1	부지경계선	2,739.81	불검출	0.01 f/cc 미만
2	# 1-2	부지경계선 2	"	2,731.98	불검출	0.01 f/cc 미만
3	# 1-3	부지경계선 3	"	2,718.93	불검출	0.01 f/cc 미만
4	# 1-4	부지경계선 4	"	2,716.33	불검출	0.01 f/cc 미만
5	# 2-1	위생설비 입구	위생설비 입구	450.98	불검출	0.01 f/cc 미만
6	# 3-1	1층 출입구1	음압기	452.72	불검출	0.01 f/cc 미만
7	# 3-2	1층 출입구2	"	454.46	불검출	0.01 f/cc 미만
8	# 3-3	경비실2	"	455.77	불검출	0.01 f/cc 미만
9	# 3-4	경비실1	"	451.85	불검출	0.01 f/cc 미만
10	# 4-1	1층 출입구1	폐기물 반출구	454.46	0.005	0.01 f/cc 미만
11	# 4-2	1층 출입구2	"	451.42	0.005	0.01 f/cc 미만
12	# 4-3	경비실2	"	455.33	불검출	0.01 f/cc 미만
13	# 4-4	경비실1	"	451.85	불검출	0.01 f/cc 미만
		## 이하여백 ##				

주1) 석면비산정도측정 및 분석방법은 석면해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법(환경부고시 제2012-79호)의 「대기오염공정시험기준」의 '환경대기 중 석면 시험방법(ES 01357.1)' 및 「실내공기질공정시험기준」의 '실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)'에 따른다.

주2) 총 포집유량 및 계수 시야 수는 검출한계 0.005개/cc 이하를 만족하여야 한다.

주3) 분석결과는 소수점 넷째자리에서 반올림하여 소수점 셋째자리까지 표기한다.


주4) 위상차현미경(PCM)법에도 불구하고 필요시 주사전자현미경(SEM)법, 투과전자현미경(TEM)법으로 분석할 수 있다.

주5) 위 분석결과는 법적인 소송과 관련하여 사용 할 수 없다.

별첨 2. 측정 지점 위치(도식도)

□ 현 장 명 : 에어리퀴드코리아 사무동 철거공사





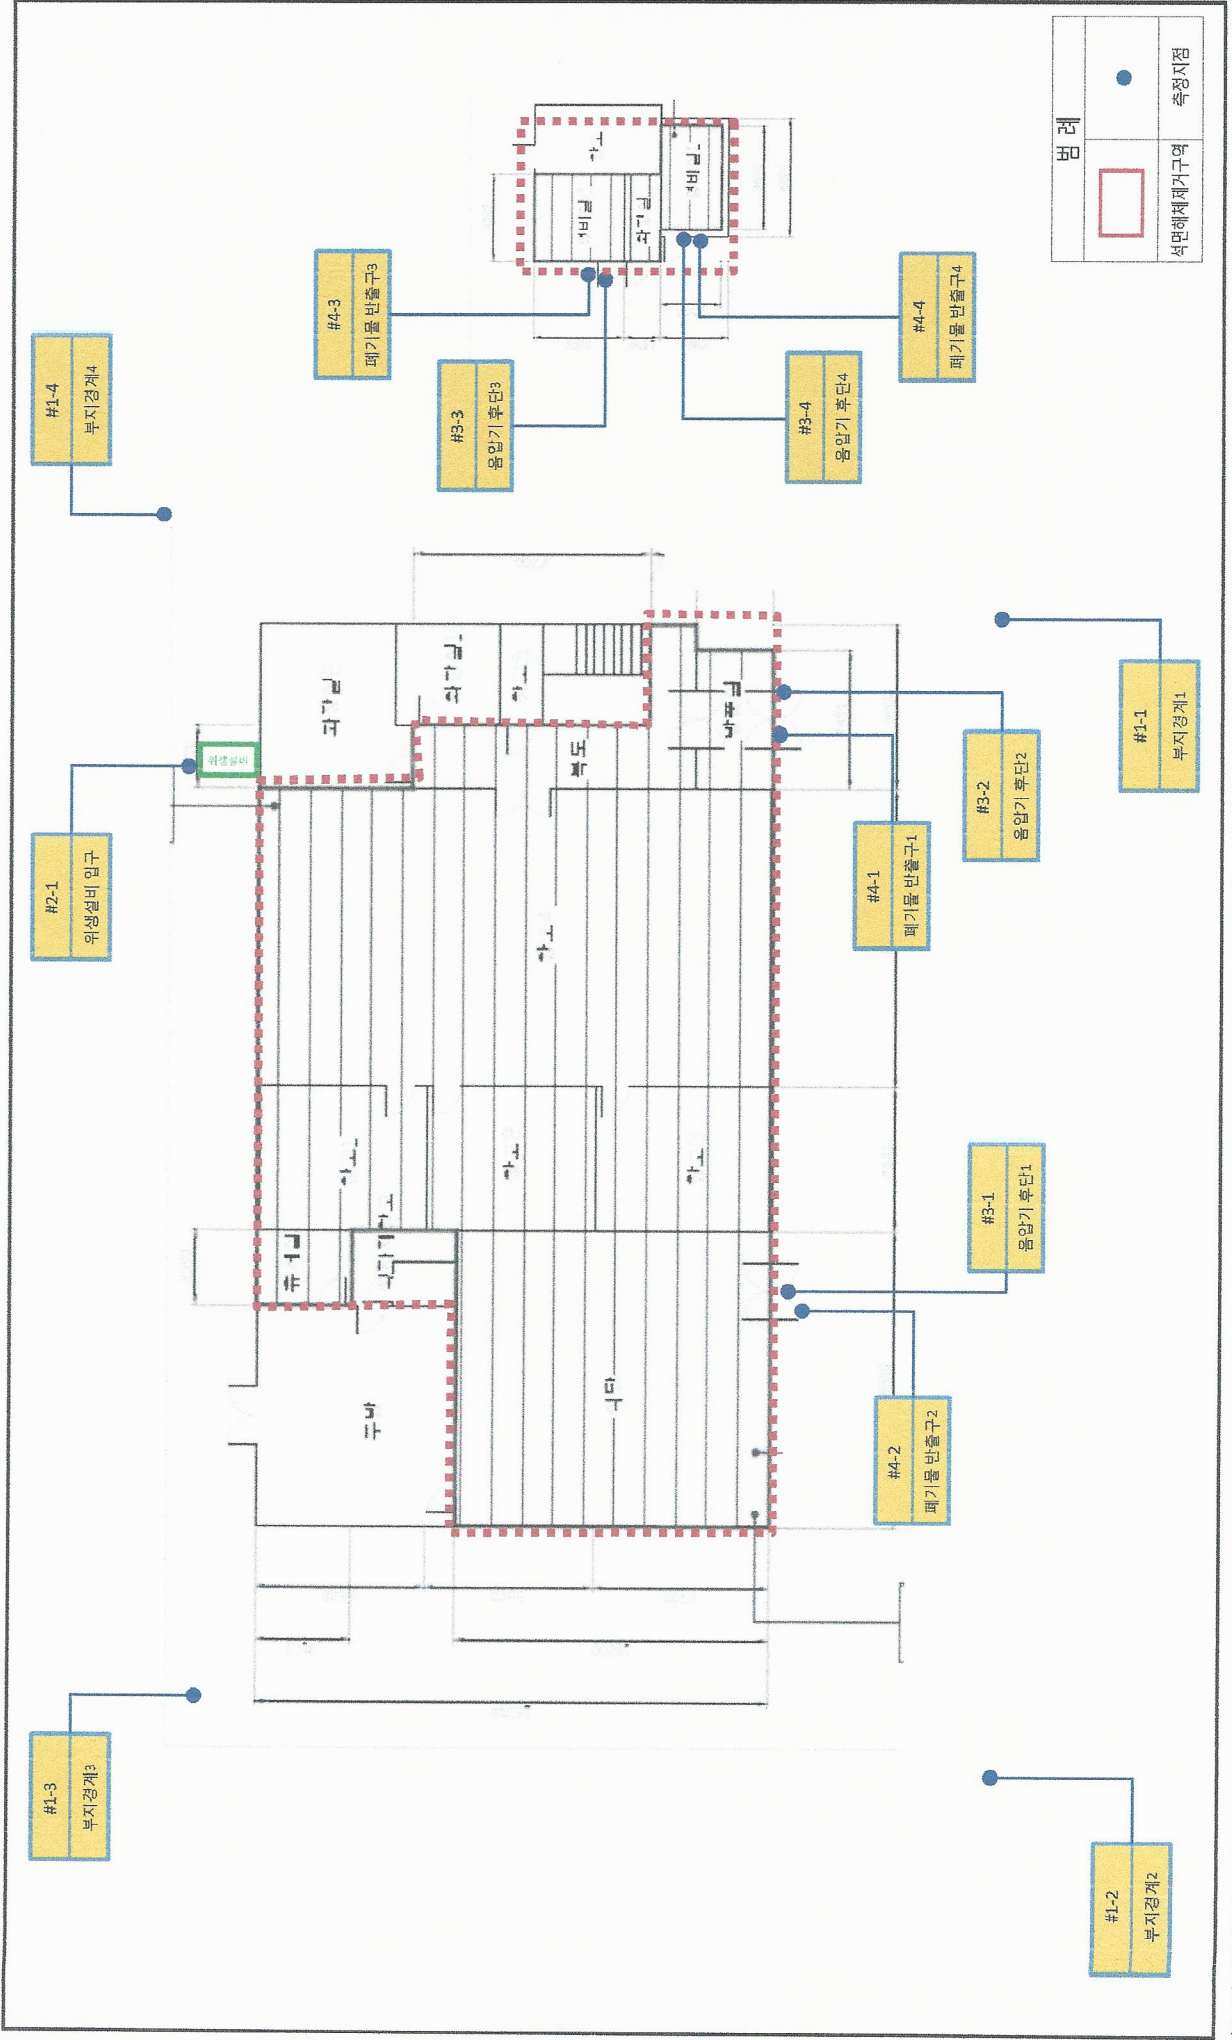





□ 측 정 일 : 2018년 2월 22일



[첨부. 시료채취 및 분석 사진]

□ 현 장 명 : 에어리퀴드코리아 사무동 철거공사

□ 측 정 일 : 2018년 2월 22일

구 분	현장사진	시료·분석사진
<p>No. 1</p> <p><input type="checkbox"/> 시료번호 : #1-1</p> <p><input type="checkbox"/> 채취위치 : 부지경계선 1 (부지경계선)</p> <p><input type="checkbox"/> 측정결과(f/cc) : 불검출</p> <p><input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합</p>		
<p>No. 2</p> <p><input type="checkbox"/> 시료번호 : #1-2</p> <p><input type="checkbox"/> 채취위치 : 부지경계선 2 (부지경계선)</p> <p><input type="checkbox"/> 측정결과(f/cc) : 불검출</p> <p><input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합</p>		
<p>No. 3</p> <p><input type="checkbox"/> 시료번호 : #1-3</p> <p><input type="checkbox"/> 채취위치 : 부지경계선 3 (부지경계선)</p> <p><input type="checkbox"/> 측정결과(f/cc) : 불검출</p> <p><input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합</p>		
<p>No. 4</p> <p><input type="checkbox"/> 시료번호 : #1-4</p> <p><input type="checkbox"/> 채취위치 : 부지경계선 4 (부지경계선)</p> <p><input type="checkbox"/> 측정결과(f/cc) : 불검출</p> <p><input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합</p>		
<p>No. 5</p> <p><input type="checkbox"/> 시료번호 : #2-1</p> <p><input type="checkbox"/> 채취위치 : 위생설비 입구 (위생설비 입구)</p> <p><input type="checkbox"/> 측정결과(f/cc) : 불검출</p> <p><input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합</p>		





□ 현 장 명 : 에어리퀴드코리아 사무동 철거공사

□ 측 정 일 : 2018년 2월 22일

구 분	현장사진	시료·분석사진
No. 6 <input type="checkbox"/> 시료번호 : #3-1 <input type="checkbox"/> 채취위치 : 1층 출입구1 (음압기) <input type="checkbox"/> 측정결과(f/cc) : 불검출 <input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합		
No. 7 <input type="checkbox"/> 시료번호 : #3-2 <input type="checkbox"/> 채취위치 : 1층 출입구2 (음압기) <input type="checkbox"/> 측정결과(f/cc) : 불검출 <input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합		
No. 8 <input type="checkbox"/> 시료번호 : #3-3 <input type="checkbox"/> 채취위치 : 경비실2 (음압기) <input type="checkbox"/> 측정결과(f/cc) : 불검출 <input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합		
No. 9 <input type="checkbox"/> 시료번호 : #3-4 <input type="checkbox"/> 채취위치 : 경비실1 (음압기) <input type="checkbox"/> 측정결과(f/cc) : 불검출 <input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합		
No. 10 <input type="checkbox"/> 시료번호 : #4-1 <input type="checkbox"/> 채취위치 : 1층 출입구1 (폐기물 반출구) <input type="checkbox"/> 측정결과(f/cc) : 0.005 <input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합		

□ 현 장 명 : 에어리퀴드코리아 사무동 철거공사

□ 측 정 일 : 2018년 2월 22일

구 분	현장사진	시료·분석사진
No. 11 <input type="checkbox"/> 시료번호 : #4-2 <input type="checkbox"/> 채취위치 : 1층 출입구2 (폐기물 반출구) <input type="checkbox"/> 측정결과(f/cc) : 0.005 <input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합		
No. 12 <input type="checkbox"/> 시료번호 : #4-3 <input type="checkbox"/> 채취위치 : 경비실2 (폐기물 반출구) <input type="checkbox"/> 측정결과(f/cc) : 불검출 <input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합		
No. 13 <input type="checkbox"/> 시료번호 : #4-4 <input type="checkbox"/> 채취위치 : 경비실1 (폐기물 반출구) <input type="checkbox"/> 측정결과(f/cc) : 불검출 <input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합	
