


[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)

한국유에스지보랄(주) 성형동 복포장 및 폐기물장쪽 외벽 석면해체제거작업

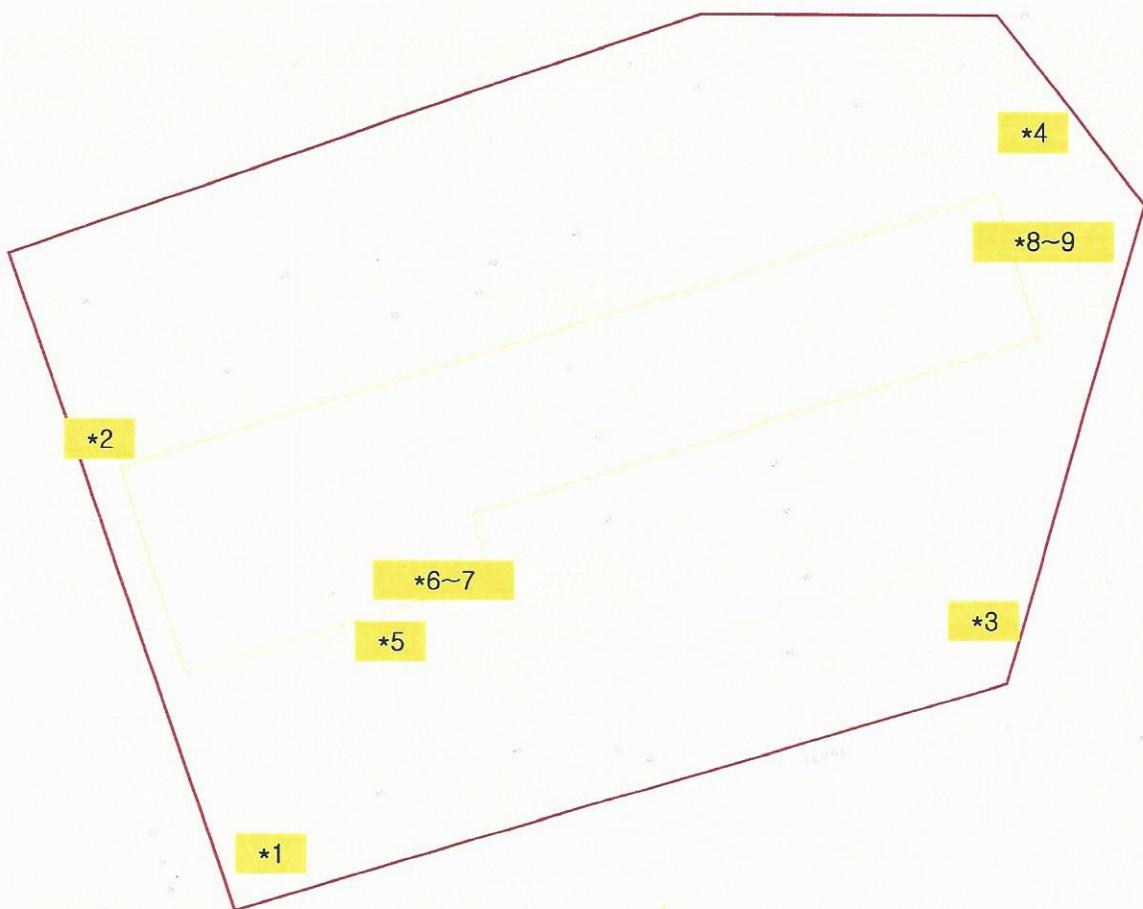

범례	*NO	부지경계선
	시료채취	

[별첨2] 측정 결과

측정위치	측정시간(분)	유량 (ℓ/min)	측정농도 [기준: 0.01개/cm³]	초과여부
*1 부지경계선1	9:33 ~ 13:33	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2 부지경계선2	9:35 ~ 13:35	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3 부지경계선3	9:42 ~ 13:42	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4 부지경계선4	9:46 ~ 13:46	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5 위생설비입구	9:38 ~ 10:18	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6 작업장주변1	9:38 ~ 11:38	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7 폐기물반출구1	9:40 ~ 10:20	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8 작업장주변2	9:55 ~ 11:55	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*9 폐기물반출구2	9:55 ~ 10:35	10.00	0.003	미만

비고

[별첨3] 측정 사진

사진			
*1. 부지경계선1	*2. 부지경계선2	*3. 부지경계선3	*4. 부지경계선4
*5. 위생설비입구	*6. 작업장주변1	*7. 폐기물반출구1	*8. 작업장주변2
	-	-	-
*9. 폐기물반출구2	-	-	-
