

석면비산측정 결과보고서

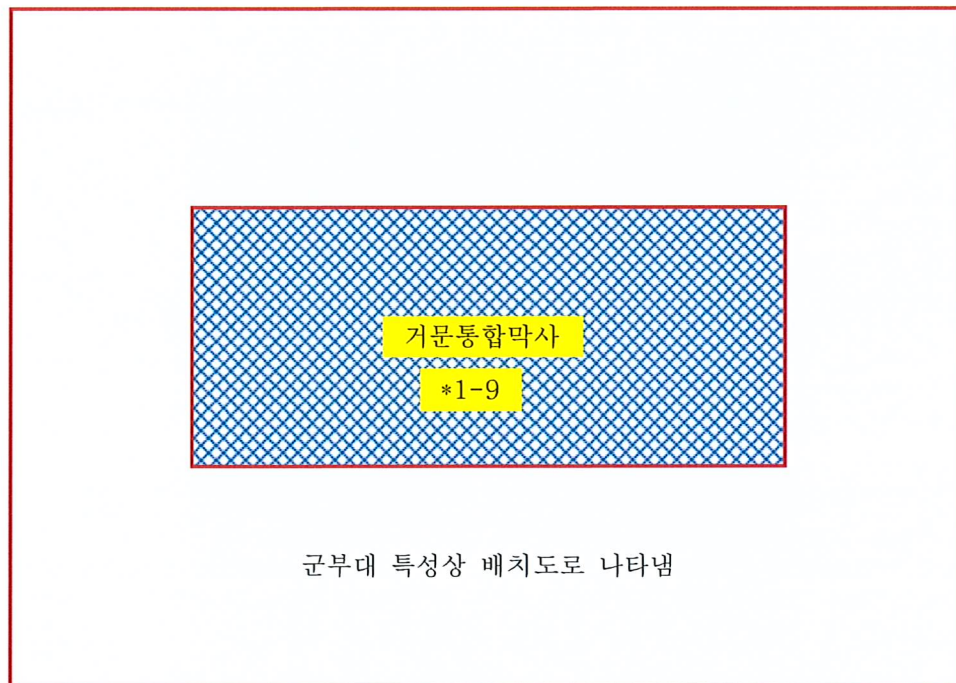
- 19-목-석면함유건축 지정폐기물철거공사 -





(주)대한환경컨설팅
CO.,LTD Daehan Environment Consulting

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)

19-목-석면함유건축 지정폐기물철거공사























범 례	*NO		
	시료채취	부지경계선	대상건축물

[별첨2] 측정 결과

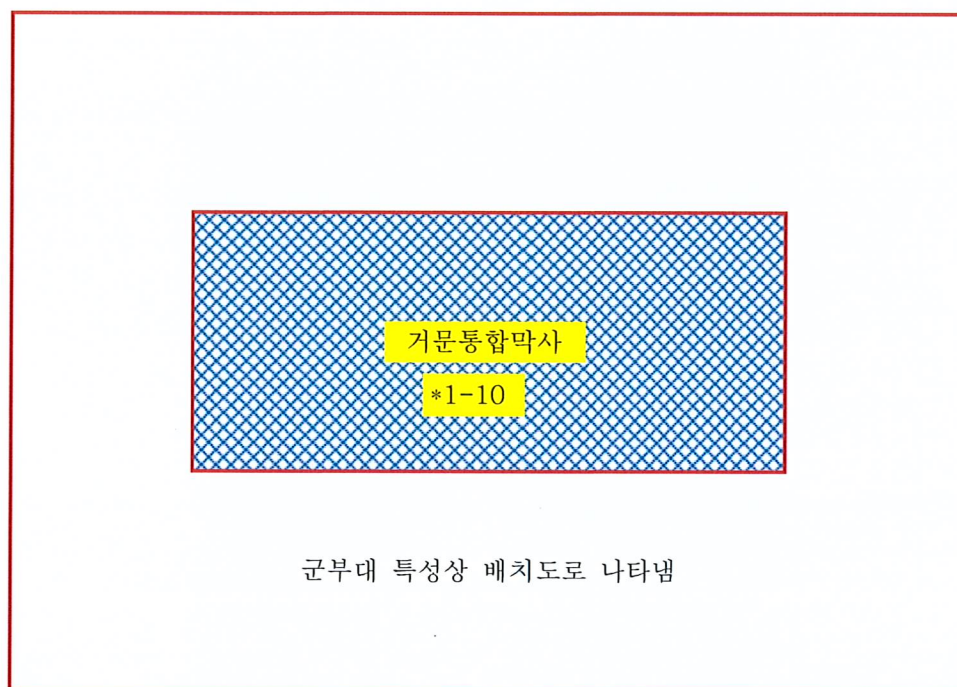
시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)		유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고
1	부지경계선1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/14	불검출[검출한계 0.002미만]	
2	부지경계선2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/14	불검출[검출한계 0.002미만]	
3	부지경계선3	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/14	불검출[검출한계 0.002미만]	
4	부지경계선4	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/14	불검출[검출한계 0.002미만]	
5	위생설비입구	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/14	불검출[검출한계 0.002미만]	
6	작업장주변	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/14	불검출[검출한계 0.002미만]	
7	음압기배출구1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/14	불검출[검출한계 0.002미만]	
8	음압기배출구2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/14	불검출[검출한계 0.002미만]	
9	폐기물반출구1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/14	불검출[검출한계 0.002미만]	
-	공시료	-		-	-	0개/100개시야	
-	공시료	-		-	-	0개/100개시야	

[별첨3] 측정 사진

부지경계선1/ 부지경계선2								
	시작시간	7:00	종료시간	7:00	시작시간	7:05	종료시간	7:05
부지경계선3/ 부지경계선4								
	시작시간	7:10	종료시간	7:10	시작시간	7:15	종료시간	7:15
위생설비입구/ 작업장주변1								
	시작시간	7:20	종료시간	7:20	시작시간	7:25	종료시간	7:25
음압기배출구1/ 음압기배출구2								
	시작시간	7:30	종료시간	7:30	시작시간	7:30	종료시간	7:30
폐기물반출구								
	시작시간	7:30	종료시간	7:30	시작시간	-	종료시간	-

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)

19-목-석면함유건축 지정폐기물철거공사








범 례	*NO		
	시료채취	부지경계선	대상건축물

[별첨2] 측정 결과

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)		유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고
1	부지경계선1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/13	불검출[검출한계 0.002미만]	
2	부지경계선2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/13	불검출[검출한계 0.002미만]	
3	부지경계선3	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/13	불검출[검출한계 0.002미만]	
4	부지경계선4	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/13	불검출[검출한계 0.002미만]	
5	위생설비입구	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/13	불검출[검출한계 0.002미만]	
6	작업장주변	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/13	불검출[검출한계 0.002미만]	
7	음압기배출구1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/13	불검출[검출한계 0.002미만]	
8	음압기배출구2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/13	불검출[검출한계 0.002미만]	
9	음압기배출구3	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/13	불검출[검출한계 0.002미만]	
10	폐기물반출구1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/13	불검출[검출한계 0.002미만]	
-	공시료	-		-	-	0개/100개시야	
-	공시료	-		-	-	0개/100개시야	

[별첨3] 측정 사진

부지경계선1/ 부지경계선2								
	시작시간	7:30	종료시간	11:30	시작시간	7:35	종료시간	11:35
부지경계선3/ 부지경계선4								
	시작시간	7:40	종료시간	11:40	시작시간	7:45	종료시간	11:45
위생설비입구 /작업장주변1								
	시작시간	7:50	종료시간	8:30	시작시간	7:55	종료시간	9:55
음압기배출구1/ 음압기배출구2								
	시작시간	8:00	종료시간	8:40	시작시간	8:00	종료시간	8:40
음압기배출구3/ 폐기물반출구								
	시작시간	8:05	종료시간	8:45	시작시간	8:00	종료시간	8:40
