1. 석면비산측정 결과표

1-1 개별 석면 해체·제거 사업장의 시료채취 지점

구분	지점		지점 수	시료 측정 위치	비 고	측정여부
작업중	부지 경계선		4개 이상	부지 경계선 높이 1.2-1.5m	우천시 제외	○
	위생설비 입구		전수 (1개 이상)	위생설비 입구 높이 1.2-1.5m 거리 1m이내	-	○
	폐기물 반출구		전수 (1개 이상)	폐기물 반출구에서 1m이내, 높이 1.2-1.5m	-	○
	작업장 주변	실내	1개 이상	작업장 주변 높이 1.2-1.5m	-건축물의 일부 공간에서 석면 해체·제거 작업이 이루어지는 경우 해당 작업장 주변을 의미함 -사용자가 없는 경우 제외	○
		실외	1개 이상	해당 건축물 외부 높이 1.2-1.5m	-대상 건축물 주변 5m 이내 (부지경계선이 대상 건축물 5m 이내에 위치 시 제외) -음압기 설치 시 제외	X
	음압기		전수 (1개 이상)	읍압기 공기 배출구 0.3-1m이내	-음압기는 배출농도를 평가하기 적합하게 설치해야 함	○
	폐기물보관지점		전수 (2개 이상)	폐기물 보관소 주변, 1m이내, 높이 1.2-1.5m	해당지점 당일 풍향 고려	○
	거주자 주거지역		(2개 이상)	해체,제거사업장가장가까운거 주지옆 2-3m 높이 1.2-1.5m	해당지점 당일 풍향 고려	X

1-2-1 석면비산측정 결과 (2021.01.23.)

측정위치	시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (측정 시간)	측정결과 (f/cc)	검출석면
배치도 표기	B-1	부지경계	SARA-5100	2400	240분	0.002	기준치이하
	B-2	부지경계	SARA-5100	2400	240분	0.002	기준치이하
	B-3	부지경계	SARA-5100	2400	240분	0.003	기준치이하
	B-4	부지경계	SARA-5100	2400	240분	0.001	기준치이하
1층/행정실	B-5	작업장주변	SARA-5100	1200	120분	0.000	기준치이하
1층/중앙출입구	B-6	위생설비1	SARA-5100	400	40분	0.008	기준치이하
1층/좌측복도	B-7	위생설비2	SARA-5100	400	40분	0.002	기준치이하
2층/음악실	B-8	음압기배출구1	SARA-5100	400	40분	0.008	기준치이하
2층/우측복도	B-9	음압기배출구2	SARA-5100	1200	2시간	0.005	기준치이하
2층/놀이실	B-10	음압기배출구3	SARA-5100	1200	2시간	0.000	기준치이하
2층/좌측복도	B-11	음압기배출구4	SARA-5100	1200	2시간	0.008	기준치이하
2층/계단실	B-12	음압기배출구5	SARA-5100	400	40분	0.008	기준치이하
1층/유치원	B-13	음압기배출구6	SARA-5100	400	40분	0.008	기준치이하
1층/중앙출입구	B-14	폐기물반출구1	SARA-5100	400	40분	0.000	기준치이하
1층/좌측복도	B-15	폐기불반출구2	SARA-5100	400	40분	0.001	기준치이하
운동장앞	B-16	폐기물보관지점1	SARA-5100	400	40분	0.004	기준치이하
운동장앞	B-17	폐기물보관지점2	SARA-5100	400	40분	0.001	기준치이하

※ 참 고

- 공기 중 농도 기준 : 0.01개/㎤ 이하
- 본 연구소의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.

분석 연구원 : 박 성 훈

푸 른 환 경 연 구 소 (주)

2. 석면비산 측정지점 위치도

측정지점 위치도 (측정일 : 2021. 01. 23)	
위 치	1층

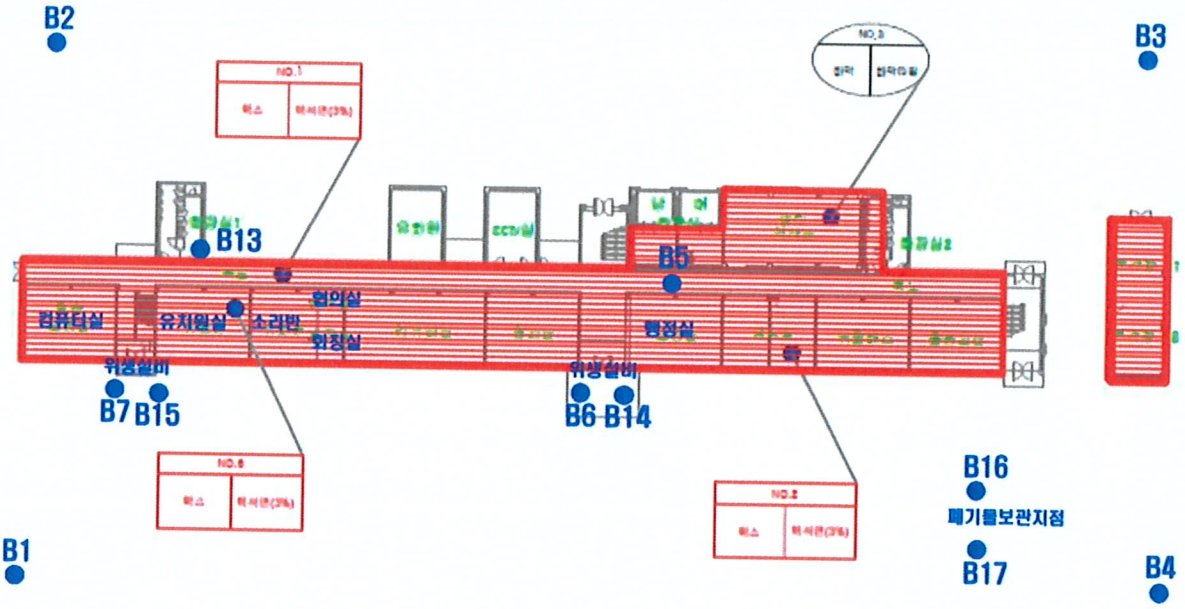

측정지점 위치도 (측정일 : 2021. 01. 23)

위 치 2층

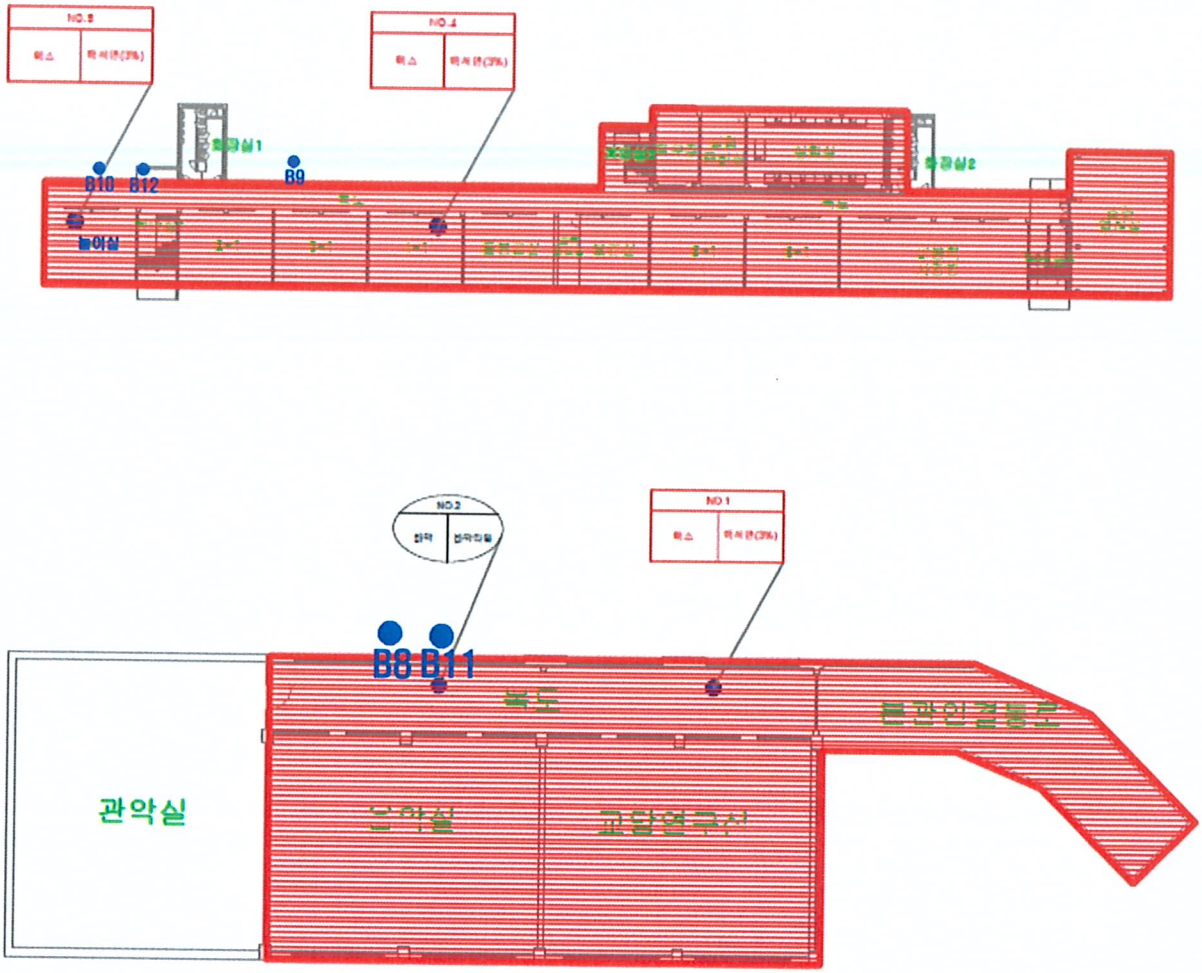

2-1. 석면비산 측정 사진대장

항목	석면비산정도측정		
측정시간	시작 : 2021년 01월 23일	종료 : 2021년 01월 23일	통보 : 2021년 01월 23일
투입장비	종류 : 지역시료채취펌프	수량 : 17대	
촬영대상	① 석면배출허용기준 준수여부체크를 위한 석면비산 측정 모습 ※ 석면 비산 측정 시기, 시료채취 수 자세한 사항은 환경부고시 『석면해체.제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법』 참조		

구분	시작사진	종료사진	시작사진	종료사진
부지 경계선 B1, B2				
측정시간	09:00	13:00	09:05	13:05

구분	시작사진	종료사진	시작사진	종료사진
부지 경계선 B3, B4				
측정시간	09:30	13:30	09:35	13:35

구분	시작사진	종료사진	시작사진	종료사진
해체 · 제거 사업장 주변 B5			-	-
측정시간	09:50	13:50	-	-
위 치	1층/교육행정실			

구분	시작사진	종료사진	시작사진	종료사진
위생설비 B6,B7				
측정시간	10:00	10:40	10:50	11:30
위 치	1층/중앙출입구		1층/좌측 출입구	

구분	시작사진	종료사진	시작사진	종료사진
음압기 배출구 B8,B9				
측정시간	11:10	11:50	11:10	11:50
위 치	2층/음악실		2층/복도(우측)	

구분	시작사진	종료사진	시작사진	종료사진
음압기 배출구 B10,B11				
측정시간	11:15	11:55	11:15	11:55
위 치	2층/놀이실		2층/좌측복도	

구분	시작사진	종료사진	시작사진	종료사진
음압기 배출구 B12,B13				
측정시간	14:00	14:40	14:10	14:50
위 치	2층/계단실		1층/유치원실	

구분	시작사진	종료사진	시작사진	종료사진
폐기물 반출구 B14,B15				
측정시간	11:10	11:50	11:30	12:10
위 치	1층/중앙 출입구		1층/좌측 복도	

구분	시작사진	종료사진	시작사진	종료사진
폐기물 보관지점 B16,B17			-	-
측정시간	15:20	16:00	-	-
위 치	운동장 옆			

1. 석면비산측정 결과표

1-1 개별 석면 해체·제거 사업장의 시료채취 지점

구분	지점		지점 수	시료 측정 위치	비 고	측정여부
작업중	부지 경계선		4개 이상	부지 경계선 높이 1.2-1.5m	우천시 제외	○
	위생설비 입구		전수 (1개 이상)	위생설비 입구 높이 1.2-1.5m 거리 1m이내	-	○
	폐기물 반출구		전수 (1개 이상)	폐기물 반출구에서 1m이내, 높이 1.2-1.5m	-	○
	작업장 주변	실내	1개 이상	작업장 주변 높이 1.2-1.5m	-건축물의 일부 공간에서 석면 해체·제거 작업이 이루어지는 경우 해당 작업장 주변을 의미함 -사용자가 없는 경우 제외	○
		실외	1개 이상	해당 건축물 외부 높이 1.2-1.5m	-대상 건축물 주변 5m 이내 (부지경계선이 대상 건축물 5m 이내에 위치 시 제외) -음압기 설치 시 제외	X
	음압기		전수 (1개 이상)	읍압기 공기 배출구 0.3-1m이내	-음압기는 배출농도를 평가하기 적합하게 설치해야 함	○
	폐기물보관지점		전수 (2개 이상)	폐기물 보관소 주변, 1m이내, 높이 1.2-1.5m	해당지점 당일 풍향 고려	○
	거주자 주거지역		(2개 이상)	해체,제거사업장가장가까운거 주지옆 2-3m 높이 1.2-1.5m	해당지점 당일 풍향 고려	X

1-2-1 석면비산측정 결과 (2021.01.24.)

측정위치	시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (측정 시간)	측정결과 (f/cc)	검출석면
배치도표기	B-1	부지경계	SARA-5100	2400	240분	0.003	기준치이하
	B-2	부지경계	SARA-5100	2400	240분	0.003	기준치이하
	B-3	부지경계	SARA-5100	2400	240분	0.003	기준치이하
	B-4	부지경계	SARA-5100	2400	240분	0.003	기준치이하
1층/행정실	B-5	작업장주변	SARA-5100	1200	120분	0.002	기준치이하
1층/중앙출입구	B-6	위생설비1	SARA-5100	400	40분	0.008	기준치이하
1층/좌측복도	B-7	위생설비2	SARA-5100	400	40분	0.006	기준치이하
2층/음악실	B-8	음압기배출구1	SARA-5100	400	40분	0.007	기준치이하
2층/우측복도	B-9	음압기배출구2	SARA-5100	400	40분	0.005	기준치이하
2층/놀이실	B-10	음압기배출구3	SARA-5100	400	40분	0.005	기준치이하
2층/좌측복도	B-11	음압기배출구4	SARA-5100	400	40분	0.007	기준치이하
2층/계단실	B-12	음압기배출구5	SARA-5100	400	40분	0.001	기준치이하
1층/유치원실	B-13	음압기배출구6	SARA-5100	400	40분	0.004	기준치이하
1층/컴퓨터실	B-14	음압기배출구7	SARA-5100	400	40분	0.001	기준치이하
1층/우측복도	B-15	음압기배출구8	SARA-5100	400	40분	0.006	기준치이하
1층/소리반	B-16	음압기배출구9	SARA-5100	400	40분	0.006	기준치이하
1층/좌측복도	B-17	음압기배출구10	SARA-5100	400	40분	0.007	기준치이하

※ 참 고

- 공기 중 농도 기준 : 0.01개/㎤ 이하
- 본 연구소의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.

분석 연구원 : 박 성 훈

푸 른 환 경 연 구 소 (주)

1-2-1 석면비산측정 결과 (2021.01.24.)

1층/중앙출입구	B-18	폐기물반출구1	SARA-5100	400	40분	0.007	기준치이하
1층/좌측복도	B-19	폐기불반출구2	SARA-5100	400	40분	0.007	기준치이하
운동장앞	B-20	폐기물보관지점1	SARA-5100	400	40분	0.007	기준치이하
운동장앞	B-21	폐기물보관지점2	SARA-5100	400	40분	0.007	기준치이하

※ 참 고

- 공기 중 농도 기준 : 0.01개/㎤ 이하
- 본 연구소의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.

분석 연구원 : 박 성 훈

푸 른 환 경 연 구 소 (주)

2. 석면비산 측정지점 위치도

측정지점 위치도 (측정일 : 2021. 01. 24)	
위 치	1층

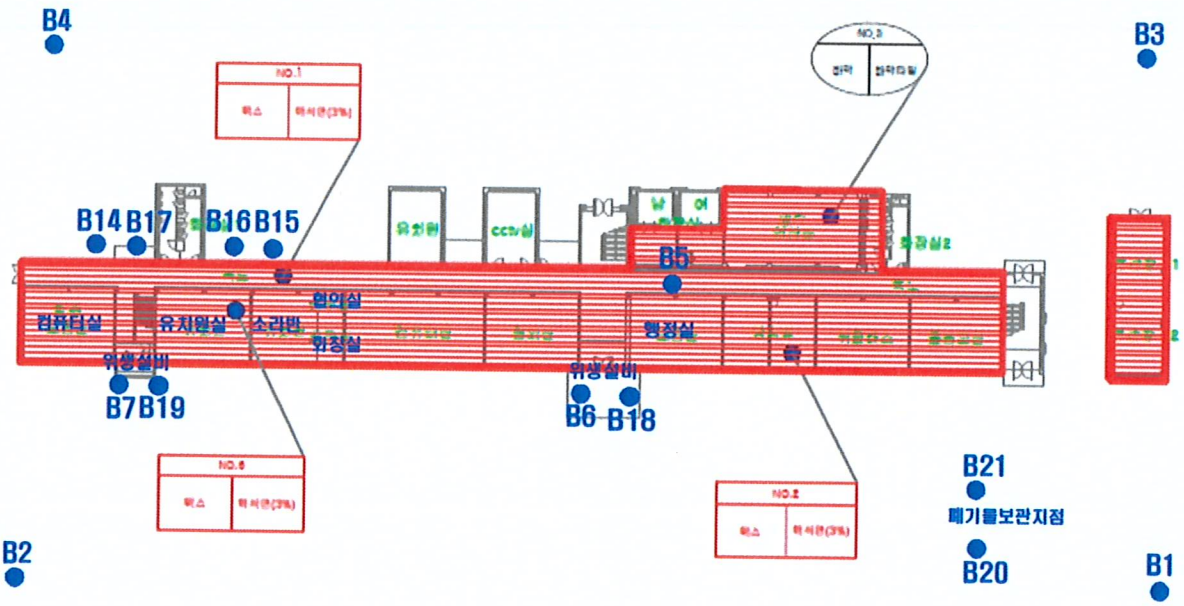

측정지점 위치도 (측정일 : 2021. 01. 24)	
위 치	2층

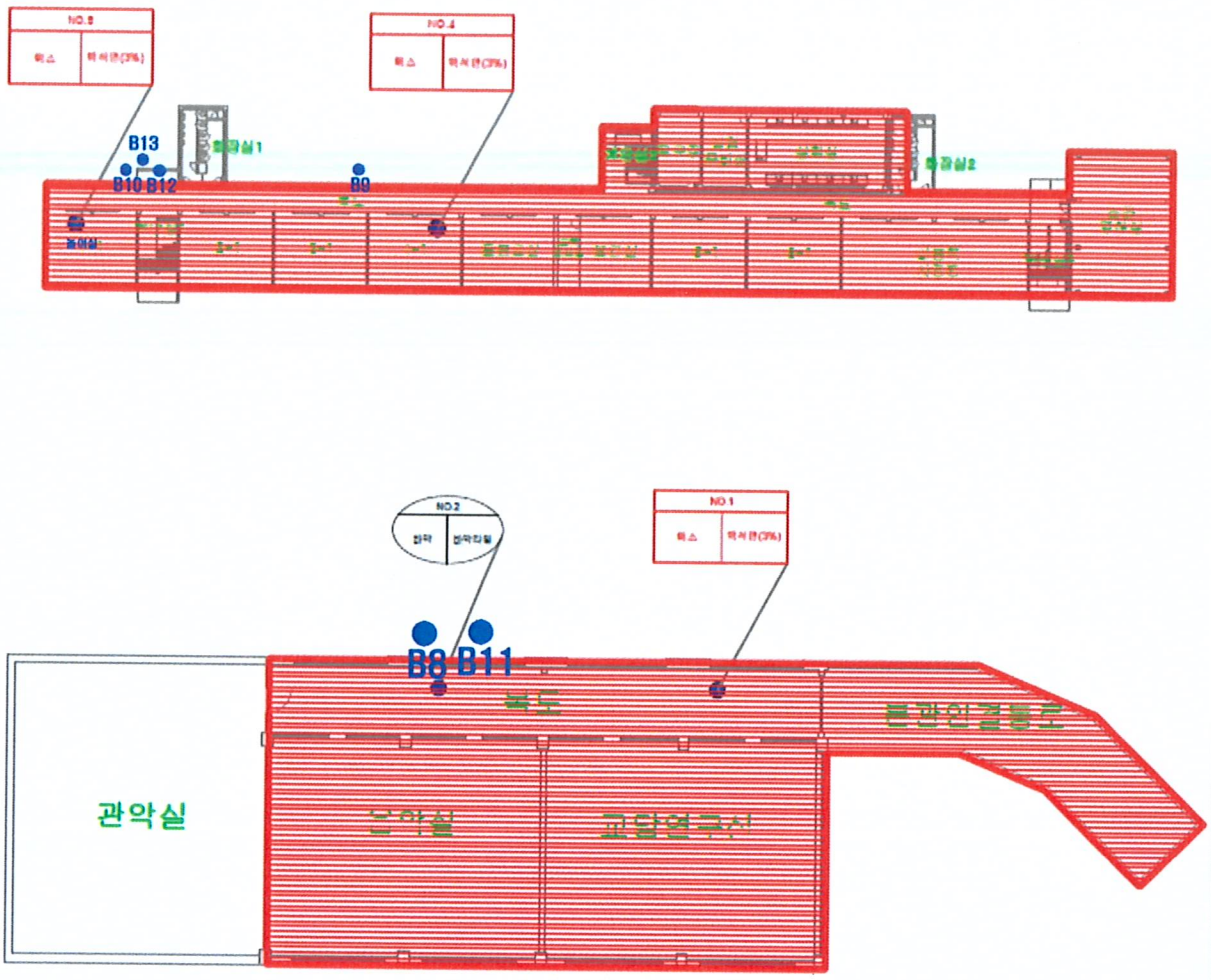

2-1. 석면비산 측정 사진대장

항목	석면비산정도측정		
측정시간	시작 : 2021년 01월 24일	종료 : 2021년 01월 24일	통보 : 2021년 01월 24일
투입장비	종류 : 지역시료채취펌프	수량 : 21대	
촬영대상	① 석면배출허용기준 준수여부체크를 위한 석면비산 측정 모습 ※ 석면 비산 측정 시기, 시료채취 수 자세한 사항은 환경부고시 『석면해체.제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법』 참조		

구분	시작사진	종료사진	시작사진	종료사진
부지 경계선 B1, B2				
측정시간	09:00	13:00	09:01	13:01

구분	시작사진	종료사진	시작사진	종료사진
부지 경계선 B3, B4				
측정시간	09:10	13:10	09:11	13:11

구분	시작사진	종료사진	시작사진	종료사진
해체 · 제거 사업장 주변 B5			-	-
측정시간	09:30	11:30	-	-
위 치	1층/교육행정실			

구분	시작사진	종료사진	시작사진	종료사진
위생설비 B6,B7				
측정시간	09:20	10:00	09:40	10:20
위 치	1층/중앙출입구		1층/좌측 출입구	

구분	시작사진	종료사진	시작사진	종료사진
음압기 배출구 B8,B9				
측정시간	09:40	10:20	09:41	10:21
위 치	2층/음악실		2층/복도(우측)	

구분	시작사진	종료사진	시작사진	종료사진
음압기 배출구 B10,B11				
측정시간	09:45	10:25	09:46	10:26
위 치	2층/놀이실		2층/좌측복도	

구분	시작사진	종료사진	시작사진	종료사진
음압기 배출구 B12,B13				
측정시간	09:50	11:30	09:55	10:35
위 치	2층/계단실		1층/유치원실	

구분	시작사진	종료사진	시작사진	종료사진
음압기 배출구 B14,B15				
측정시간	10:00	10:40	10:05	10:45
위 치	1층/컴퓨터실		1층/우측복도	

구분	시작사진	종료사진	시작사진	종료사진
음압기 배출구 B16,B17				
측정시간	10:10	10:50	10:11	10:51
위 치	1층/소리반		1층/좌측복도	

구분	시작사진	종료사진	시작사진	종료사진
폐기물 반출구 B18,B19				
측정시간	10:10	10:50	11:00	11:40
위 치	1층/중앙 출입구		1층/좌측 복도	

구분	시작사진	종료사진	시작사진	종료사진
폐기물 보관지점 B20,B21			-	-
측정시간	11:55	12:35	-	-
위 치	운동장 옆			

1. 석면비산측정 결과표

1-1 개별 석면 해체·제거 사업장의 시료채취 지점

구분	지점		지점 수	시료 측정 위치	비 고	측정여부
작업중	부지 경계선		4개 이상	부지 경계선 높이 1.2-1.5m	우천시 제외	○
	위생설비 입구		전수 (1개 이상)	위생설비 입구 높이 1.2-1.5m 거리 1m이내	-	○
	폐기물 반출구		전수 (1개 이상)	폐기물 반출구에서 1m이내, 높이 1.2-1.5m	-	X
	작업장 주변	실내	1개 이상	작업장 주변 높이 1.2-1.5m	-건축물의 일부 공간에서 석면 해체·제거 작업이 이루어지는 경우 해당 작업장 주변을 의미함 -사용자가 없는 경우 제외	○
		실외	1개 이상	해당 건축물 외부 높이 1.2-1.5m	-대상 건축물 주변 5m 이내 (부지경계선이 대상 건축물 5m 이내에 위치 시 제외) -음압기 설치 시 제외	X
	음압기		전수 (1개 이상)	읍압기 공기 배출구 0.3-1m이내	-음압기는 배출농도를 평가하기 적합하게 설치해야 함	○
	폐기물보관지점		전수 (2개 이상)	폐기물 보관소 주변, 1m이내, 높이 1.2-1.5m	해당지점 당일 풍향 고려	○
	거주자 주거지역		(2개 이상)	해체,제거사업장가장가까운거 주지옆 2-3m 높이 1.2-1.5m	해당지점 당일 풍향 고려	X

1-2-1 석면비산측정 결과 (2021.01.25.)

측정위치	시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (측정 시간)	측정결과 (f/cc)	검출석면
배치도 표기	B-1	부지경계	SARA-5100	2400	240분	0.001	기준치이하
	B-2	부지경계	SARA-5100	2400	240분	0.001	기준치이하
	B-3	부지경계	SARA-5100	2400	240분	0.001	기준치이하
	B-4	부지경계	SARA-5100	2400	240분	0.001	기준치이하
1층/행정실	B-5	작업장주변	SARA-5100	1200	120분	0.000	기준치이하
1층/중앙출입구	B-6	위생설비1	SARA-5100	400	40분	0.000	기준치이하
1층/유치원	B-7	음압기배출구1	SARA-5100	400	40분	0.008	기준치이하
1층/컴퓨터실	B-8	음압기배출구2	SARA-5100	400	40분	0.001	기준치이하
1층/우측복도	B-9	음압기배출구3	SARA-5100	400	40분	0.001	기준치이하
1층/좌측복도	B-10	음압기배출구4	SARA-5100	400	40분	0.001	기준치이하
1층/소리반	B-11	음압기배출구5	SARA-5100	400	40분	0.000	기준치이하
운동장앞	B-12	폐기물보관지점1	SARA-5100	400	40분	0.001	기준치이하
운동장앞	B-13	폐기물보관지점2	SARA-5100	400	40분	0.000	기준치이하

※ 참 고

- 공기 중 농도 기준 : 0.01개/㎤ 이하
- 본 연구소의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.

분석 연구원 : 박 성 훈

푸 른 환 경 연 구 소 (주)

2. 석면비산 측정지점 위치도

측정지점 위치도 (측정일 : 2021. 01. 25)	
위 치	1층/부지경계, 위생설비, 음압기배출구, 폐기물보관지점

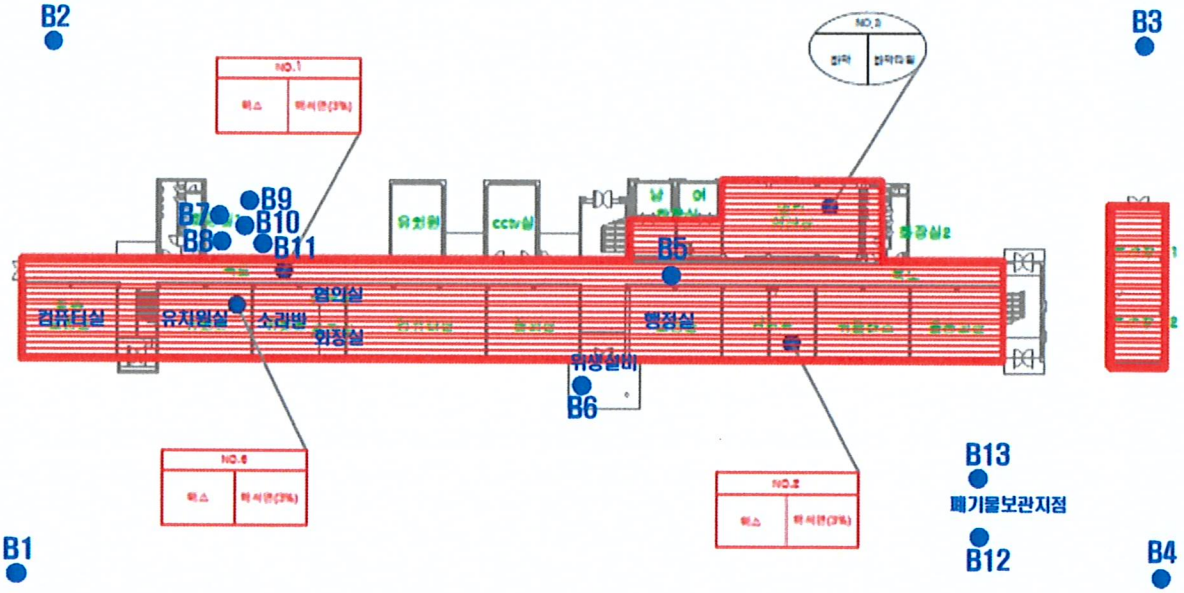

2-1. 석면비산 측정 사진대장

항목	석면비산정도측정		
측정시간	시작 : 2021년 01월 25일	종료 : 2021년 01월 25일	통보 : 2021년 01월 25일
투입장비	종류 : 지역시료채취펌프	수량 : 13대	
촬영대상	① 석면배출허용기준 준수여부체크를 위한 석면비산 측정 모습 ※ 석면 비산 측정 시기, 시료채취 수 자세한 사항은 환경부고시 『석면해체.제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법』 참조		

구분	시작사진	종료사진	시작사진	종료사진
부지 경계선 B1, B2				
측정시간				

구분	시작사진	종료사진	시작사진	종료사진
부지 경계선 B3, B4				
측정시간				

구분	시작사진	종료사진	시작사진	종료사진
해체 · 제거 사업장 주변 B5			-	-
측정시간			-	-
위 치	1층/교육행정실			

구분	시작사진	종료사진	시작사진	종료사진
위생설비 B6			-	-
측정시간			-	-
위 치	1층/중앙출입구		-	

구분	시작사진	종료사진	시작사진	종료사진
음압기 배출구 B7,B8				
측정시간				
위 치	1층/유치원		1층/컴퓨터실	

구분	시작사진	종료사진	시작사진	종료사진
음압기 배출구 B9,B10				
측정시간				
위 치	1층/우측복도		1층/좌측복도	

구분	시작사진	종료사진	시작사진	종료사진
음압기 배출구 B11			-	-
측정시간			-	-
위 치	1층/소리반		-	

구분	시작사진	종료사진	시작사진	종료사진
폐기물 보관지점 B12,B13			-	-
측정시간			-	-
위 치	운동장 옆			

별첨) 석면조사기관 지정서

1. 석면비산측정 결과표

1-1 개별 석면 해체·제거 사업장의 시료채취 지점

구분	지점		지점 수	시료 측정 위치	비 고	측정여부
작업중	부지 경계선		4개 이상	부지 경계선 높이 1.2-1.5m	우천시 제외	X
	위생설비 입구		전수 (1개 이상)	위생설비 입구 높이 1.2-1.5m 거리 1m이내	-	X
	폐기물 반출구		전수 (1개 이상)	폐기물 반출구에서 1m이내, 높이 1.2-1.5m	-	X
	작업장 주변	실내	1개 이상	작업장 주변 높이 1.2-1.5m	-건축물의 일부 공간에서 석면 해체·제거 작업이 이루어지는 경우 해당 작업장 주변을 의미함 -사용자가 없는 경우 제외	X
		실외	1개 이상	해당 건축물 외부 높이 1.2-1.5m	-대상 건축물 주변 5m 이내 (부지경계선이 대상 건축물 5m 이내에 위치 시 제외) -음압기 설치 시 제외	X
	음압기		전수 (1개 이상)	읍압기 공기 배출구 0.3-1m이내	-음압기는 배출농도를 평가하기 적합하게 설치해야 함	X
	폐기물보관지점		전수 (2개 이상)	폐기물 보관소 주변, 1m이내, 높이 1.2-1.5m	해당지점 당일 풍향 고려	○
	거주자 주거지역		(2개 이상)	해체,제거사업장가장가까운거 주지옆 2-3m 높이 1.2-1.5m	해당지점 당일 풍향 고려	X

1-2-1 석면비산측정 결과 (2021.01.26.)

측정위치	시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (측정 시간)	측정결과 (f/cc)	검출석면
운동장앞	B-1	폐기물보관지점1	SARA-5100	400	40분	0.002	기준치이하
운동장앞	B-2	폐기물보관지점2	SARA-5100	400	40분	0.002	기준치이하

※ 참 고

- 공기 중 농도 기준 : 0.01개/㎤ 이하
- 본 연구소의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.

분석 연구원 : 박 성 훈

푸 른 환 경 연 구 소 (주)

2. 석면비산 측정지점 위치도

측정지점 위치도 (측정일 : 2021. 01. 26)	
위 치	폐기물보관지점

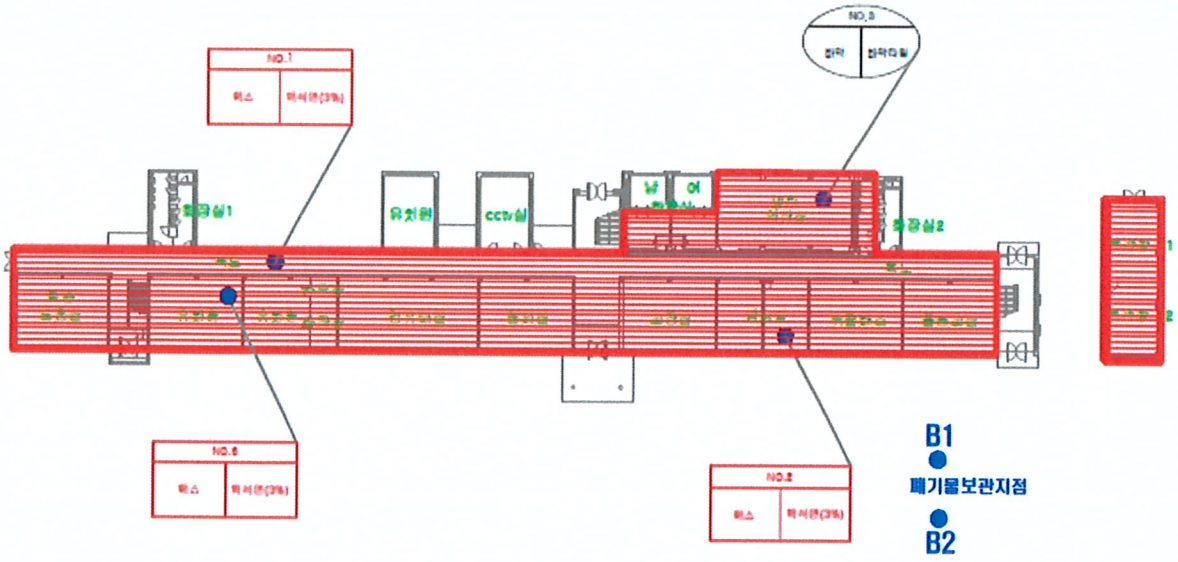

2-1. 석면비산 측정 사진대장

항목	석면비산정도측정		
측정시간	시작 : 2021년 01월 26일	종료 : 2021년 01월 26일	통보 : 2021년 01월 26일
투입장비	종류 : 지역시료채취펌프	수량 : 2대	
촬영대상	① 석면배출허용기준 준수여부체크를 위한 석면비산 측정 모습 ※ 석면 비산 측정 시기, 시료채취 수 자세한 사항은 환경부고시 『석면해체.제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법』 참조		

구분	시작사진	종료사진	시작사진	종료사진
폐기물 보관지점 B1,B2			-	-
측정시간	09:00	09:40	-	-
위 치	운동장 옆			

1. 석면비산측정 결과표

1-1 개별 석면 해체·제거 사업장의 시료채취 지점

구분	지점		지점 수	시료 측정 위치	비 고	측정여부
작업중	부지 경계선		4개 이상	부지 경계선 높이 1.2-1.5m	우천시 제외	X
	위생설비 입구		전수 (1개 이상)	위생설비 입구 높이 1.2-1.5m 거리 1m이내	-	X
	폐기물 반출구		전수 (1개 이상)	폐기물 반출구에서 1m이내, 높이 1.2-1.5m	-	○
	작업장 주변	실내	1개 이상	작업장 주변 높이 1.2-1.5m	-건축물의 일부 공간에서 석면 해체·제거 작업이 이루어지는 경우 해당 작업장 주변을 의미함 -사용자가 없는 경우 제외	X
		실외	1개 이상	해당 건축물 외부 높이 1.2-1.5m	-대상 건축물 주변 5m 이내 (부지경계선이 대상 건축물 5m 이내에 위치 시 제외) -음압기 설치 시 제외	X
	음압기		전수 (1개 이상)	읍압기 공기 배출구 0.3-1m이내	-음압기는 배출농도를 평가하기 적합하게 설치해야 함	X
	폐기물보관지점		전수 (2개 이상)	폐기물 보관소 주변, 1m이내, 높이 1.2-1.5m	해당지점 당일 풍향 고려	○
	거주자 주거지역		(2개 이상)	해체,제거사업장가장가까운거 주지옆 2-3m 높이 1.2-1.5m	해당지점 당일 풍향 고려	X

1-2-1 석면비산측정 결과 (2021.01.27.)

측정위치	시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (측정 시간)	측정결과 (f/cc)	검출석면
운동장앞	B-1	폐기물보관지점1	SARA-5100	400	40분	0.005	기준치이하
	B-2	폐기물보관지점2	SARA-5100	400	40분	0.001	기준치이하
	B-3	폐기물반출1	SARA-5100	400	40분	0.000	기준치이하
	B-4	폐기물반출2	SARA-5100	400	40분	0.001	기준치이하

※ 참 고
- 공기 중 농도 기준 : 0.01개/㎤ 이하
- 본 연구소의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.

분석 연구원 : 박 성 훈

푸 른 환 경 연 구 소 (주)

2. 석면비산 측정지점 위치도

측정지점 위치도 (측정일 : 2021. 01. 27)	
위 치	폐기물보관지점, 폐기물반출

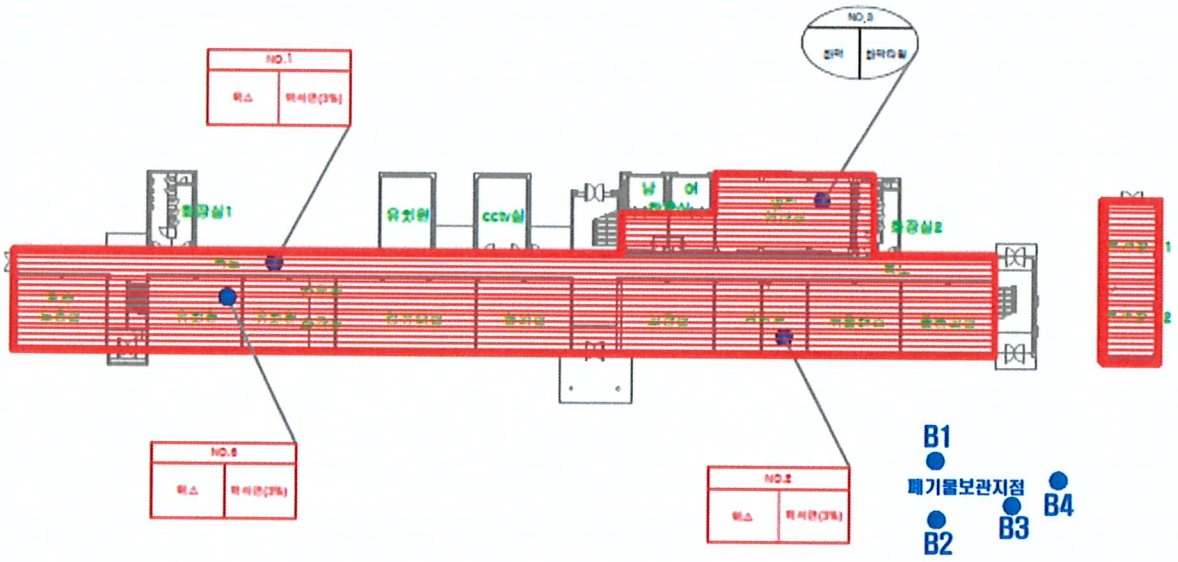

2-1. 석면비산 측정 사진대장

항목	석면비산정도측정		
측정시간	시작 : 2021년 01월 27일	종료 : 2021년 01월 27일	통보 : 2021년 01월 27일
투입장비	종류 : 지역시료채취펌프	수량 : 4대	
촬영대상	① 석면배출허용기준 준수여부체크를 위한 석면비산 측정 모습 ※ 석면 비산 측정 시기, 시료채취 수 자세한 사항은 환경부고시 『석면해체.제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법』 참조		

구분	시작사진	종료사진	시작사진	종료사진
폐기물 보관지점 B1,B2			-	-
측정시간	09:00	09:40	-	-
위 치	운동장 옆			

구분	시작사진	종료사진	시작사진	종료사진
폐기물 반출구 B3,B4			-	-
측정시간	10:30	11:10	-	-
위 치	운동장 옆			
